

# **SŒURS CARMELITES MISSIONNAIRES THERESIENNES NDIAFFATE - KAOLACK (SENEGAL)**



## **RAPPORT PROJET DU POSTE DE SANTE ET DU CENTRE DE PROMOTION FEMININE**



BREF RAPPEL DU PROJET			
PAYS	SENEGAL		
<b>PROJET DU POSTE DE SANTÉ ET DU CENTRE DE PROMOTION FÉMININE</b>			
Demandeur	Fr. Marie-Joseph DOL, Carmes déchaux BP 214 KAOLACK SENEGAL Tél : + 221 77 857 18 42 E-Mail : marie-joseph@carmel.asso.fr		
Responsable du projet	Fr. Marie-Joseph DOL, Carmes déchaux BP 214 KAOLACK SENEGAL Tél : + 221 77 857 18 42 E-Mail : marie-joseph@carmel.asso.fr		
Co-Responsable du projet	Sr. Elsie & Sr Anastasie, Carmélites Missionnaire Thérésienne BP 214 KAOLACK SENEGAL Tél : + +221 76 418 48 86 E-Mail : barumwetemaisha@gmail.com		
Répondant juridique	Fr. Marie-Joseph DOL, Carmes déchaux BP 214 KAOLACK SENEGAL Tél : + 221 77 857 18 42 E-Mail : marie-joseph@carmel.asso.fr		
Plan de dépenses et de recettes			
2.1 Dépenses		Devis initial	Facture réelle
	Imprimante Sony UP_25MD (A6couleur) avec papier, et gel pour échographe du poste de santé	2 524 €	2 532 €
	Devis estimatif pour fenêtres et portes au centre de promotion féminine	2 929 €	2 929 €
	Devis estimatif pour 2 armoires métalliques au centre de promotion féminine	678 €	305 €
	<b>Total des dépenses</b>	<b>6 131 €</b>	<b>5 766 €</b>
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE			
Début du projet	Novembre 2022		
Fin du projet	Décembre 2022		

# **RAPPORT FINAL DU PROJET DE SOUTIEN DU POSTE DE SANTÉ**

## **ET DU CENTRE DE PROMOTION FÉMININE**

### **DE KEUR MARIAMA, NDIAffATE, KAOLACK (SÉNÉGAL)**

#### **1. ORGANISATION QUI PRESENTE LA DEMANDE**

Projet est présenté par les frères Carmes déchaux

Responsable délégué : Fr. Marie Joseph DOL, Carme déchaux

Co-responsable : Sr Elsie, Carmélite Missionnaire Thérésienne

#### **2. LIEU DU PROJET**

Sœurs Carmélites Missionnaires Thérésiennes, Keur Mariama

Commune de NdiAffate

Kaolack

SENEGAL



### **3. Rapport narratif**

Dès l'approbation du projet, nous avons pu acheter directement en France l'imprimante échographe et le gel échographe, ainsi que le papier clichés. L'ensemble de ce matériel a été livré à Port Vendres où un partenaire de notre mission a accepté de le prendre en bateau et de le livrer à Dakar. La livraison s'est faite début décembre 2022. L'installation de l'imprimante s'est faite mi-décembre 2022. Elle se poursuivra en janvier avec le technicien de maintenance.

Les ouvriers de l'entreprise ABY Technologies sont venus au centre de promotion féminine fin novembre 2022 et ils ont fait un premier travail en posant les fenêtres et portes prévus. Puis ils sont revenus en décembre 2022 pour les finitions et la peinture.

Après avoir pris des renseignements sur les armoires métalliques, nous avons constaté que les entreprises n'étaient pas fiables. Nous avons finalement opté pour acheter des armoires métalliques au port de Dakar à l'importation et nous en avons trouvé d'occasion pour moitié prix. Ce qui explique l'écart entre le devis et la facture finale. Il reste à rénover ces armoires métalliques (bricolage et peinture), mais nous le ferons nous-mêmes. Il reste aussi à surélever ces armoires pour pouvoir nettoyer dessous, avec des pieds à fixer, le ferronnier de Nidaffate le fera.

### **4. Rapport financier**

Factures des dépenses :

- HEXAMED : 2.531,51 €
- ABY Technologies portes et fenêtres : 1.921.040 Fcfa soit 2.928,61 €
- ABY Technologies armoires métalliques importées : 200.000 Fcfa soit 304,90 €


Total = 5.765,02 €


Les factures justificatives sont jointes à ce rapport.

Il reste donc 366 € des dons de l'opération de Carême non utilisés. Nous proposons de le reverser aux sœurs Carmélites Missionnaires Thérésiennes pour leurs besoins pour le poste de santé et la promotion féminine si vous n'y voyez pas d'inconvénients :

- ***Payer le technicien d'installation de l'imprimante échographe (devis de 230 €)***
- ***Payer le ferronnier pour surélever les armoires métalliques***

5. PHOTOS:

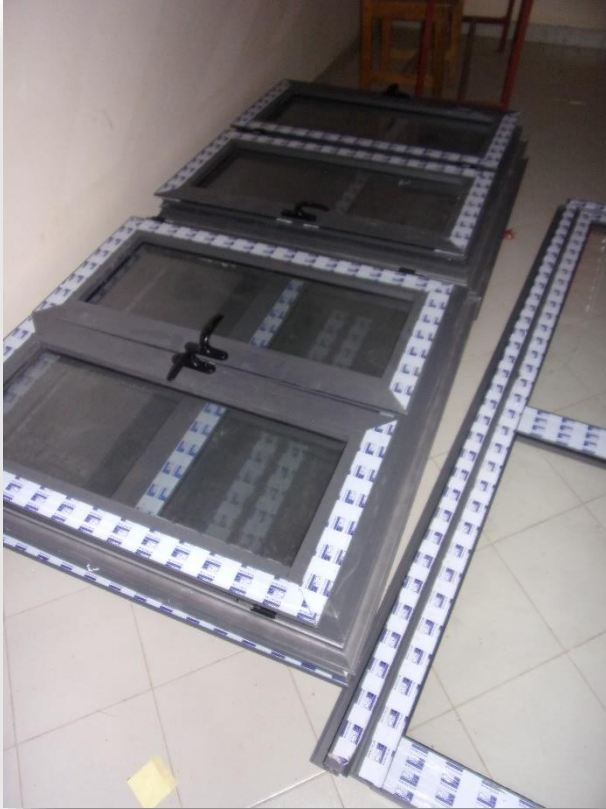

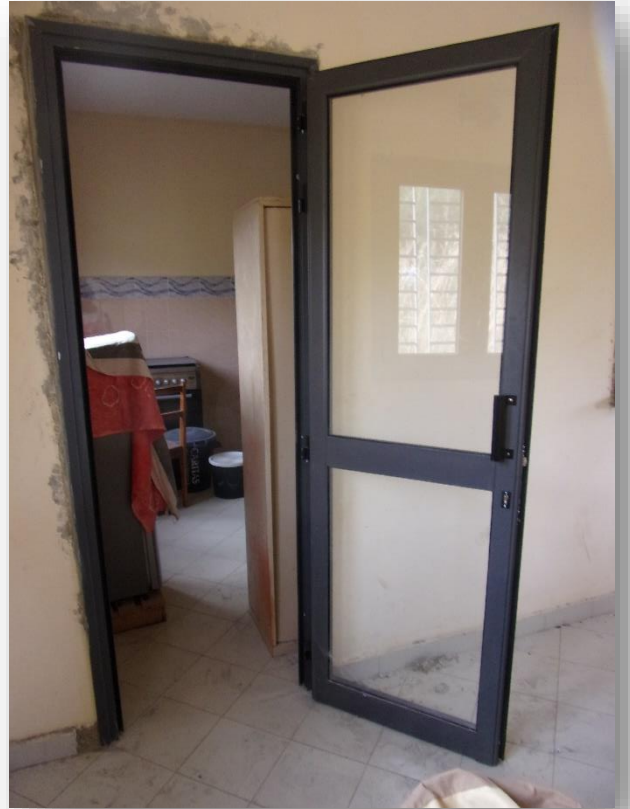



**HEXAMED MATERIEL MEDICAL**  
 295 Route Nationale 97  
 83130 LA GARDE  
 Tél : 04 94 13 06 69 - Fax : 09 72 28 38 40  
 E-Mail : serviceclients@hexamed.fr  
 www.xraystore.fr

Page 1 / 1

**PROCURE DES MISSIONS**  
**10 BIS RUE MOQUIN TANDON**  
**34090 MONTPELLIER**  
**FRANCE**

## F A C T U R E

### LIVRAISON

TRANSIT FRUITS SERVICE EXPORT QUAI DE LA PRESQU'ILE PROCURE MISSIONS COUVENT CARMES SENEGAL 66660 PORT VENDRES FRANCE	Contact : - - E-Mail : procure.mission@gmail.com Tél : 04 68 98 30 54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Réf. Affaire : AC22101214  
 N° Commande : CC22101214  
 Réf. Commande : 103544  
 Réf. BL : LF22101571 - BL22101574

Référence	Désignation	Quantité	PU TTC	Montant TTC
10724URO	Imprimante Sony UP-25MD (A6, couleur) Garantie : 1 an 27/10/2022 BL N° LF22101571 : Qté = 1	1	2 390.00	2 390.00
17732MME	Papier thermique Sony UPC-21S (boite de 240 clichés) 27/10/2022 BL N° BL22101574 : Qté = 1	1	125.00	125.00
12672HBG!	Gel ultrason Heltis Line (cubitainer 5 litres) 27/10/2022 BL N° BL22101574 : Qté = 1	1	16.51	16.51
Garanties : ne sont pas couverts les consommables, accessoires (hors mention contraire) et pièces d'usure. Concernant le mobilier, la sellerie n'est pas couverte.				

<b>Base HT</b>	<b>Taux TVA</b>	<b>Montant TVA</b>	<b>Total TTC :</b>	<b>2 531.51 €</b>
2 109.59	20.00 %	421.92	Dont TVA :	421.92 €

**Date d'échéance : 28/10/2022**

**Mode de règlement : Virement bancaire**

*Facture acquittée*

**RESERVE DE PROPRIETE** : loi du 12/05/1980 N°80335 - Le matériel livré reste l'entière propriété de HEXAMED MATERIEL MEDICAL jusqu'au paiement intégral du prix fixé ci-dessus.

**Intérêt de retard** : A défaut et conformément à la loi 2008-776 du 4 Août 2008, un intérêt de retard égal à 3 fois le taux légal sera appliqué, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012)

HEXAMED MATERIEL MEDICAL - SAS au capital de 24 250 Euros - immatriculée au RCS TOULON 510 281 553 - N° TVA : FR80510281553 - Code NAF : 4646Z

Nos coordonnées bancaires

IBAN	BIC	Domiciliation
FR7630003004630002571337583	SOGEFRPP	SOCIETE GENERALE - BOURGES (00463)

facture de travaux POUR LA POSE DE MENUISERIES ALUMINIUM SUR LE BATIMENT EXISTANT DU CENTRE DE PROMOTION FEMININE DES SCEURS CARMELITE THERESIENNE DE KEUR MARIAMA A N'DIAFATE

FOURNITURE DE DEUX ARMOIRES MÉTALLIQUE POUR LE COMPTE DU CENTRE DE PROMOTION FEMININE DES SCEURS CARMELITE THERESIENNE DE KEUR MARIAMA A N'DIAFATE

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	P.UNITAIRE	P.TOTAL
Fourniture d'armoire métallique	U	2	100 000	200 000
<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HTVA</b>				<b>200 000</b>

Cette présente facture est arrêtée à la somme de deux cent mille francs CFA

Dakar ce 05/12/2022

Aby Technologies  
Construction Générale Mécanique Hydraulique  
Prestations de Services  
Tél : 77 27 42 86 836 44 45



ABYTECHNOLOGIES CONSTRUCTION CIVIL HYDRAULIQUE PRESTATION DE SERVICES PA MALIKA U9 N° 298 RC DAKAR  
2007 14276 NINEA 294184882D1 BP 34060 DAKAR THIAROYE  
TEL 33 836 85 45 - 77 271 60 86

facture de travaux POUR LA POSE DE MENUISERIES ALUMINIUM SUR LE BATIMENT EXISTANT DU CENTRE DE PROMOTION  
FEMININE DES SCEURS CARMELITE THERESIENNE DE KEUR MARIAMA A N'DIAFATE

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	P.UNITAIRE	P.TOTAL
Dépose de sfenêtres existante	ENS	4	12 000	48 000
F&P de fenêtrés alu ouvrant à la française 1,6X1,2	ENS	4	180 000	720 000
F&P de grille de protection dim 1,7X1,4	ENS	4	90 000	360 000
F&P de pourt alu dim 2,36X0,82	ENS	1	220 000	220 000
F&P de porte moustiquaire dim 2,36X1,2	ENS	1	280 000	280 000
<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HTVA</b>				<b>1 628 000</b>
<b>MONTANT TVA</b>			<b>18%</b>	<b>293 040</b>
<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TTC</b>				<b>1 921 040</b>

Cette présente facture est arrêtée à la somme de un million neuf cent vingt un mille quarante francs.

Dakar ce 03/12/2022

Aby Technologies  
Construction Génie Civil Hydraulique  
Prestation de Services  
Tel : 77 271 60 86 - 33 836 85 45
